

Buku Panduan Penggunaan Sistem Pelaporan Proyek

Pedoman navigasi dashboard, pengisian identitas laporan, pengukuran metrik WBS yang terukur, pencatatan instalasi dan pengadaan material, manajemen kendala, hingga ekspor laporan PDF akhir.

**STEP 3: WBS / PEKERJAAN**[+ Tambah Item](#)

URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (%)	AKTUAL (%)	STATUS
Persiapan & Peng.	15	0	0	
Pemasangan Pipa	20	0	0	
Penarikan Kabel U	25	0	0	

SYSDEV ENGINEERING TEAM

Alamat: Jl. Sudirman No. 123, Jakarta

Email: support@sysdev.co.id

Edisi Tablet Android 2026 • v1.0

Panduan Lengkap Untuk Site Engineer & PM

1. Pendahuluan Sistem & Fitur Utama	Halaman 2
2. Navigasi Antarmuka & Dashboard Utama	Halaman 3
3. Pengisian Identitas & Parameter Waktu	Halaman 4
4. Manajemen WBS & Pengukuran Progress (Terukur)	Halaman 5
5. Pencatatan Instalasi, Pengadaan & Alat Kerja	Halaman 6
6. Manajemen Kendala & Lampiran Dokumentasi	Halaman 7
7. Validasi, Cetak PDF & Ekspor Dokumen Akhir	Halaman 8

★ Pendahuluan Sistem Pelaporan Tablet

Aplikasi Manajemen Proyek SysDev didesain khusus dengan pendekatan **Mobile-First & Responsif** untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengawas lapangan (*Site Engineer*) dalam melakukan pelaporan kemajuan pekerjaan secara cepat, presisi, dan terarah tanpa perlu membuka laptop.



Cepat & Responsif

Dukungan layout dinamis yang menyesuaikan otomatis saat rotasi tablet, tanpa tampilan terpotong.



Metrik Akurat

Sistem otomatis menghitung deviasi keterlambatan berdasarkan target vs aktual pada WBS.



Ekspor PDF Instan

Satu sentuhan untuk menghasilkan laporan PDF profesional lengkap dengan area tanda tangan.

Rekomendasi Penggunaan Tablet

Gunakan tablet dengan resolusi layar minimal 10 inchi dalam orientasi **Landscape** untuk kenyamanan terbaik saat memasukkan data tabel yang banyak.

Halaman Dashboard memberikan gambaran menyeluruh (*helicopter view*) mengenai daftar proyek yang sedang Anda kelola.



- 1 Buka aplikasi dan Anda akan langsung diarahkan ke halaman **Dashboard**.
- 2 Cari kartu proyek yang ingin Anda perbarui datanya. Kartu ini berisi ringkasan nama proyek, klien, dan lokasi.
- 3 Tekan tombol "**Buka Laporan**" berwarna biru. Anda akan dipindahkan masuk ke dalam ruang kerja (*Workspace*) proyek tersebut.

Identitas laporan sangat penting karena data ini akan dicetak langsung di bagian *Header* (Kop) laporan PDF resmi yang diserahkan ke klien.

URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (%)	AKTUAL (%)	STATUS
Persiapan & Peng.	15	0	0	
Pemasangan Pipa	20	0	0	
Penarikan Kabel U	25	0	0	

Gambar 2.1: Form Pengisian Identitas Proyek

- 1 Isi kolom **Project Name**, **Client**, dan **Location** sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- 2 Tentukan **Periode (Mingguan/Harian)** dan **Tanggal (Date)**. Tanggal ini akan otomatis tercetak di samping kolom tanda tangan PDF.
- 3 Masukkan matriks terukur: **Target Waktu (Hari)** dan **Sisa Waktu (Hari)** untuk memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada manajemen mengenai sisa durasi pengerjaan.

Tips Efisiensi

Sistem akan secara otomatis menyimpan (*auto-save*) ketikan Anda di perangkat sementara. Pastikan ejaan nama klien sudah benar sebelum mencetak PDF.

Work Breakdown Structure (WBS) adalah fitur untuk memonitor kemajuan fisik secara **terukur dan terarah**. Sistem menyediakan form tabel dinamis yang akan menghitung kalkulasi secara otomatis.

STEP 3: WBS / PEKERJAAN [+ Tambah Item](#)

URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	TARGET (%)	AKTUAL (%)	STATUS
Nama Pekerjaan	0	0	0	Status
Nama Pekerjaan	0	0	0	Status
Nama Pekerjaan	0	0	0	Status

STEP 4: DETAIL PROGRES INSTALASI

A. INSTALASI KABEL [+ Tambah](#)

Lantai 1 dalam ruang	0	Status
----------------------	---	--------

Gambar 3.1: Tabel Dinamis WBS dengan Penghitungan Otomatis

Memahami Metrik Pengukuran

Variabel	Penjelasan & Logika Sistem
Bobot (%)	Nilai persentase pentingnya pekerjaan. Total keseluruhan item idealnya mencapai 100%.
Target & Aktual (%)	Target adalah rencana minggu ini, Aktual adalah realisasi di lapangan.
Deviasi (Kalkulasi Otomatis)	Dihitung otomatis: $\text{Aktual} - \text{Target} = \text{Deviasi}$. Minus (Keterlambatan), Plus (Percepatan).

1

Tekan tombol **+ Tambah Item** di sudut kanan atas tabel untuk menambah baris pekerjaan baru.

2

Ubah status pekerjaan. Sistem menggunakan pewarnaan pintar: **TO DO (Putih)** , **IN PROGRESS (Biru)** , dan **UNDER REVIEW (Kuning)** .

Pekerjaan dipecah ke dalam spesifikasi teknis (Instalasi Kabel & Kamera) serta pengadaan logistik material dan alat kerja.

Instalasi Kabel / Kamera

Pengukuran didasarkan pada Volume satuan (Titik/Roll). Terdapat 3 status akhir:

COMPLETED Selesai sempurna.

REVISION NEEDED Perlu revisi.

REWORK Dikerjakan ulang.

Alur Pengadaan Material

Memonitor kedatangan barang secara terarah menggunakan pipeline:

VOLUME (TARGET)



TIBA (ON SITE)




TERPASANG (INSTALLED)

Pencatatan Kendala & Risiko

Laporan Anda dituntut untuk menganalisa *blocker* (hambatan) di lapangan menggunakan format 4 langkah:

Deskripsi Kendala	Dampak	Tindakan Koreksi	PIC
Hujan badai selama 4 jam	Pekerjaan atap tertunda 1 hari	Shift malam penambahan pekerja	Bpk. Agus

Tahap finalisasi menuntut Anda untuk mengunggah bukti fisik pekerjaan (maksimal 8 foto) dan mencetak dokumen tersebut.

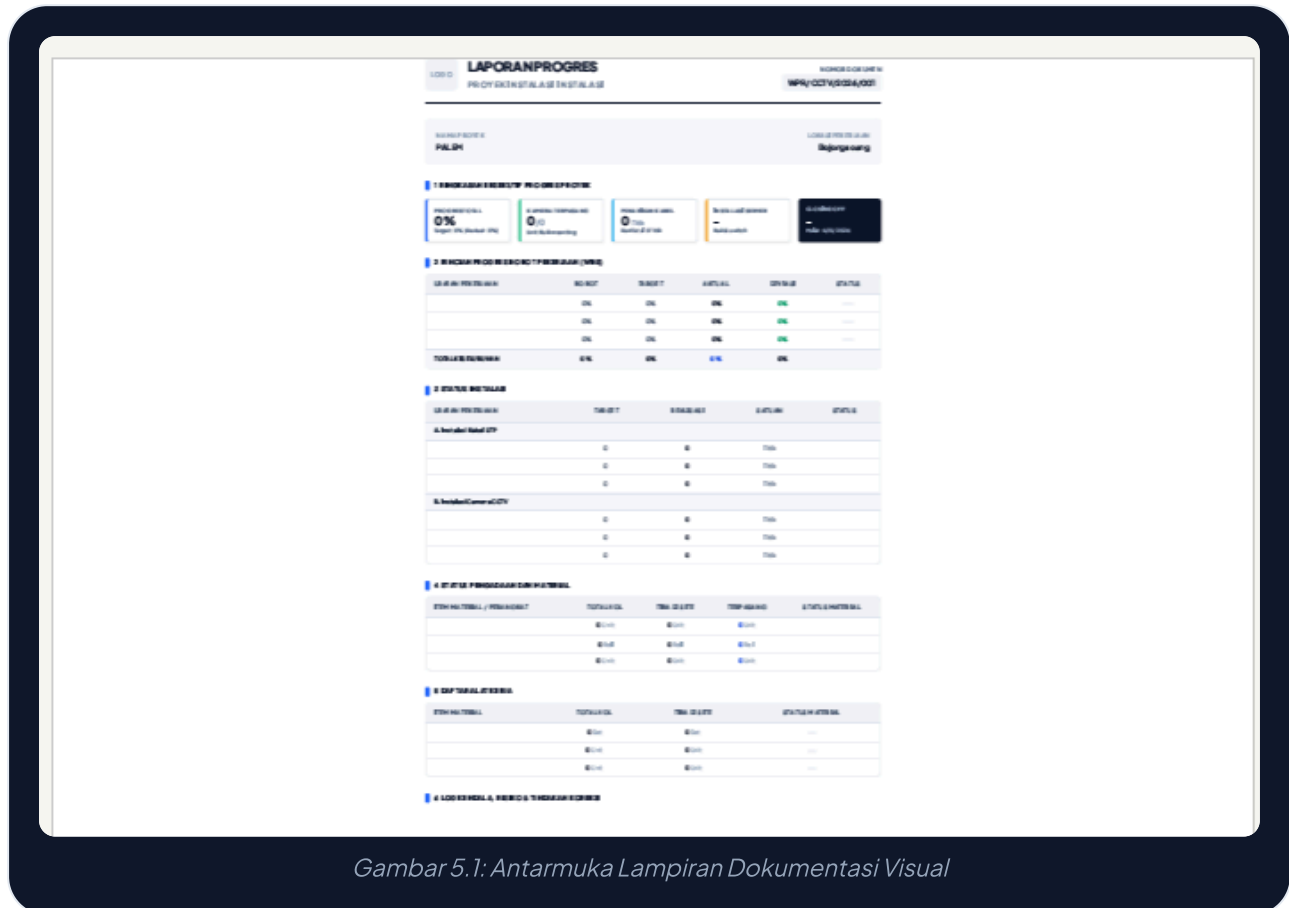

Gambar 5.1: Antarmuka Lampiran Dokumentasi Visual

- 1 Tekan tombol "**Pilih Gambar**" pada panel foto. Anda bisa mengambil langsung dari kamera tablet atau galeri.
- 2 Ketik **Caption/Deskripsi** di bawah gambar untuk menjelaskan foto tersebut kepada Klien.
- 3 Pastikan Anda telah mengisi Nama dan Jabatan pada kotak **Dibuat Oleh** dan **Mengetahui** di paling atas aplikasi.
- 4 Tekan tombol biru "**Cetak / Simpan PDF**" di pojok kanan atas.

Integritas & Automasi Cetak PDF

Saat Anda menekan tombol Cetak, sistem secara cerdas akan menyembunyikan semua elemen UI operasi (Tombol Tambah/Hapus, Dropdown border, Bayangan) agar hasil PDF terlihat seperti Dokumen Kertas Formal (*Print-Ready*), serta memperlebar ruang untuk area Tanda Tangan Anda.
